

RINGKASAN LAPORAN

3

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

- **Pengurusan Projek Bekalan Air Luar
Bandar Sarawak dan Sabah**

PENGURUSAN PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR SARAWAK DAN SABAH

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

LATAR BELAKANG

MULAI RMKe-2


- Dilaksanakan di bawah *Skim Accelerated Rural Water Supply*
- Kaedah pembiayaan 80% pinjaman dan 20% geran Kerajaan Persekutuan dengan Pihak Berkuasa Air Negeri (PBAN) sebagai agensi pelaksana

BERMULA RMKe-8


- KKDW telah dilantik sebagai agensi pelaksana
- Kaedah pembiayaan secara 100% geran Kerajaan Persekutuan

PERUNTUKAN & PERBELANJAAN


Kos Projek
RM1.647 bilion




Kos Projek
RM1.735 bilion

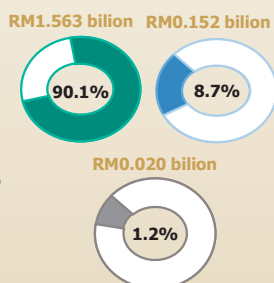

NOTA:

-  - BALB Retikulasi & BALB Naik Taraf/Bina Baru Loji
-  - BALB Alternatif
-  - BALB Sekunder

3 KOMPONEN PROJEK

BALB NAIK TARAF/ BINA BARU LOJI



Loji Rawatan Air

BALB RETIKULASI



Meter Air

- Pembinaan Tangki Simpanan Air dan Stesen Pam Penggalak
- Penyambungan paip air sistem retikulasi

BALB ALTERNATIF



Paip Utama di Dam Alternatif

- Membina telaga tiub, telaga terbuka, sistem air graviti dan sebagainya

AGENSI PELAKSANA



KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH



Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak



Jabatan Mineral & Geosains Malaysia



Pejabat Daerah Negeri Sabah

OBJEKTIF BALB

Menyediakan kemudahan air bersih dan terawat agar taraf kesihatan dan kualiti hidup masyarakat di kawasan luar bandar dapat dipertingkatkan

PENGAUDITAN

OBJEKTIF PENGAUDITAN

Menentukan sama ada projek BALB Sarawak dan Sabah dilaksanakan secara **ekonomik, cekap dan berkesan** bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan iaitu **menyediakan kemudahan bekalan air bersih dan terawat**

SKOP AUDIT

Meliputi **projek sambungan dari RMKe-10 dan RMKe-11**

Justifikasi pemilihan sampel:

- Skop Program
- Status projek
- Operator air/penduduk kampung
- Lokasi projek

KESELURUHAN PROJEK



- 28 BALB Retikulasi
- 7 BALB Naik Taraf/Bina Baru Loji
- 61 BALB Alternatif

SARAWAK



- 361 BALB Retikulasi
- 16 BALB Naik Taraf/Bina Baru Loji
- 100 BALB Alternatif

SABAH

SAMPEL AUDIT



- 18 BALB Retikulasi
- 7 BALB Naik Taraf/Bina Baru Loji
- 11 BALB Alternatif



- 73 BALB Retikulasi
- 14 BALB Naik Taraf/Bina Baru Loji
- 15 BALB Alternatif

PENGAUDITAN

METODOLOGI PENGAUDITAN



Semakan fail, rekod dan dokumen projek



Analisis data projek



Tempoh pengauditan bulan Disember 2022 – Oktober 2023



Pemeriksaan fizikal (Sarawak: Daerah Kuching, Sri Aman dan Miri) (Sabah – Daerah Keningau, Kuala Penyu, Beaufort, Sandakan, Semporna dan Ranau)



Perbincangan, temu bual dan edaran borang soal selidik bersama pegawai dan penduduk



Tempoh rekod dan dokumen tahun 2016 – 2023

PENEMUAN AUDIT

RUMUSAN AUDIT

**TIDAK
TERCAPAI**

Kelemahan fungsi dan pelaksanaan projek yang tidak selari dengan objektif BALB berkaitan taraf kesihatan dan kualiti hidup tidak dapat diukur

Sasaran pencapaian projek tidak konsisten kerana diturunkan dari penetapan asal tanpa justifikasi

Peruntukan disalurkan tidak dibuat pembayaran pada tahun semasa

Projek yang siap tidak digunakan dan tidak diselenggara

ISU AUDIT

32,229 Rumah Kawasan Luar Bandar Tidak Menerima Bekalan Air Bersih dan Terawat

- 12 Projek BALB Sarawak (RM888.32 juta) & 24 projek BALB Sabah (RM758.84 juta) masih dalam perancangan, sepatutnya telah bermula/ siap
- Tempoh kelewatan antara 5 - 7 tahun (kelulusan projek 2016, 2017 & 2018)

Tangki Tidak Digunakan

Tangki perkhidmatan RM9.20 juta bagi projek Saluran Paip Utama dari Loji Batu Kitang ke Tangki Bukit Entingan & ke Tangki Batu 9 ¾ Samarahan tidak digunakan selama 5 tahun 9 bulan oleh LAK sejak siap pada 19 Mac 2018



BALB ALTERNATIF

63.9% Penyambungan Meter Tidak Dibuat

2,442 (63.9%) daripada 3,824 rumah tidak membuat penyambungan meter disebabkan penduduk tidak mampu kerana kos penyambungan meter yang tinggi (RM750 – RM1,000) setiap rumah



BALB RETIKULASI



BALB NAIK TARAF/BINA BARU LOJI

Pencapaian Projek Siap Rendah

Pencapaian **51.9%** (35 projek BALB Sarawak) & **34.4%** (377 projek BALB Sabah) bagi RMKe-11 termasuk projek sambungan RMKe-10



AGENSI PELAKSANA



KKDW

Penetapan Sasaran Keberhasilan Tidak Menyeluruh

Penetapan sasaran keberhasilan (RMKe-11) hanya mengambilkira projek BALB Retikulasi dan tidak termasuk projek BALB Alternatif kerana hanya membekalkan air bersih sahaja

Komponen Aset Projek Rosak

- Pam *submersible* (RM99,000) & *air blower* (RM36,450) di LRA Kg. Limbawang, Beaufort
- Sistem pam, peralatan sokongan bagi sistem *Electro Chlorination* (EC) (RM1.21 juta) & sistem pemproses enap cemar (RM449,959) di LRA Jaya Bakti, Beluran
- Saluran paip bocor & set generator - gangguan bekalan air kerap berlaku di 2 projek BALB Retikulasi iaitu Kg. Lalsun & Kg. Semawang

Pelarasan Penurunan Sasaran

Pencapaian KPI KKDW hanya tercapai selepas membuat penetapan semula objektif, output & keberhasilan projek BALB menyebabkan penurunan sasaran sebanyak **84.8%** bagi Sarawak & **83.4%** bagi Sabah

Penyaluran Peruntukan Bukan Kepada Agensi Pelaksana (RISDA)

- RM6.22 juta baki peruntukan yang dilaporkan bukan baki sebenar:
 - BALB Sarawak - RM1.24 juta (2017)
 - BALB Sabah - RM4.98 juta (2020)
- RM109.56 juta peruntukan disalurkan ke RISDA (agensi pembayar):
 - BALB Sarawak - RM12 juta
 - BALB Sabah - RM97.56 juta

SYOR AUDIT

Mengkaji semula sasaran dan objektif program supaya lebih realistik, boleh diukur dan konsisten berdasarkan kebolehcapaian serta kemampuan melaksanakan projek

Menambah baik garis panduan sedia ada agar lebih komprehensif dengan mengambilkira koordinasi dengan Kerajaan Negeri melalui perbincangan isu berkaitan projek (sebelum dan selepas penyerahan projek) meliputi aspek penguatkuasaan dan penyenggaraan

Memastikan pengurusan dan kawalan kewangan dilaksanakan dengan menyelenggara rekod peruntukan dan perbelanjaan yang tepat serta dibelanja mengikut keperluan dan ketetapan

