

RINGKASAN LAPORAN

2

KEMENTERIAN EKONOMI

Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi
Pantai Timur

- **Pengurusan Projek dan Program
di Bawah Wilayah Ekonomi Pantai
Timur (ECER)**

PENGURUSAN PROJEK DAN PROGRAM DI BAWAH WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER)

KEMENTERIAN EKONOMI

MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR



LATAR BELAKANG



- **ECERDC ditubuhkan** pada 13 Jun 2008 sebagai sebuah agensi Persekutuan di bawah Akta Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 2008 [Akta 688].
- **Berfungsi** untuk memudah cara pembangunan wilayah menerusi kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan pihak Kerajaan Negeri dalam melaksanakan projek-projek strategik, berimpak tinggi dan pemangkin untuk mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di Wilayah ECER.
- **Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)** merangkumi Kelantan, Terengganu, Pahang serta daerah Mersing dan Segamat di Johor.
- **7 KDA/Nod** merangkumi 32 daerah di Wilayah ECER telah diwujudkan bagi memastikan pembangunan yang bertumpu dan optimum.

PENGAUDITAN

- Pengauditan dijalankan terhadap projek dan program di Wilayah ECER yang dilaksanakan oleh ECERDC di bawah **RMKe-9 hingga RMKe-12** melibatkan **109 projek dan program** dengan kos keseluruhan berjumlah **RM8.015 bilion**.
- Sejumlah **RM6.762 bilion peruntukan diterima** sehingga **31 Disember 2022** dengan **RM6.557 bilion telah dibelanjakan** manakala **baki RM204.11** juta belum dibelanjakan disebabkan projek masih dalam perancangan, dalam pelaksanaan serta projek siap tetapi akaun akhir sedang dimuktamadkan.

OBJEKTIF

Menilai sama ada pengurusan projek dan program di Wilayah ECER dirancang dan dilaksana secara **ekonomik, cekap** dan **berkesan** bagi **mencapai objektif yang ditetapkan**.

METODOLOGI



Menyemak fail, rekod dan dokumen di ECERDC dan agensi berkaitan.



Analisis data:
• Pelaburan ECERDC




Pemeriksaan fizikal Audit



Temu bual & perbincangan bersama pegawai ECERDC & PMC

109 projek dan program di Wilayah ECER yang dilaksanakan oleh ECERDC di bawah **RMKe-9 hingga RMKe-12** sejak **tahun 2008** sehingga **31 Disember 2022**.

SKOP



Sebanyak **16 Projek (RM3.542 bilion) & 1 Program (RM69.20 juta)** dipilih sebagai **sampel pengauditan**

LOGISTIK & PERKHIDMATAN

PEMBANGUNAN MODAL INSAN



PERNIAGAAN TANI



PEMBUATAN

Melibatkan 4 kluster & 3 Negeri



Pahang



Kelantan



Terengganu

PENEMUAN AUDIT

RUMUSAN AUDIT

Pencapaian prestasi projek dan program yang dirancang dalam RMKe-9 hingga RMKe-12 telah dilaksana oleh ECERDC **melebihi 90%**.

A.

Sasaran prestasi bagi **Pelan Induk ECER 1.0 (EMP 1.0)** tidak tercapai manakala pencapaian sebenar bagi **EMP 2.0** masih belum boleh dinilai.

B.

Pengukuran pencapaian objektif projek dan program tidak dibuat.

C.

Kelemahan pengurusan projek seperti plot perindustrian tidak diisi dan infrastruktur projek yang telah siap tetapi tidak digunakan/rosak.

ISU AUDIT

A. Sasaran Prestasi Tidak Tercapai

i. Sasaran Pendapatan Peserta Tidak Tercapai



17/30

Sebanyak 17 (57%) daripada 30 peserta tidak mencapai sasaran pendapatan ditetapkan sepanjang tempoh 2017 hingga 2021 bagi projek PAP, SKA & BSA.

ii. Peserta Program Tidak Diambil Bekerja




842/1,040

Seramai 842 (81%) daripada 1,040 peserta tidak diambil bekerja oleh Syarikat Induk selepas penyerahan dibuat bagi projek PAP, SKA & BSA.

iii. EMP 1.0 Tidak Mencapai Sasaran

Sasaran : Tiada penetapan sasaran
Pencapaian : Tidak dapat dinilai

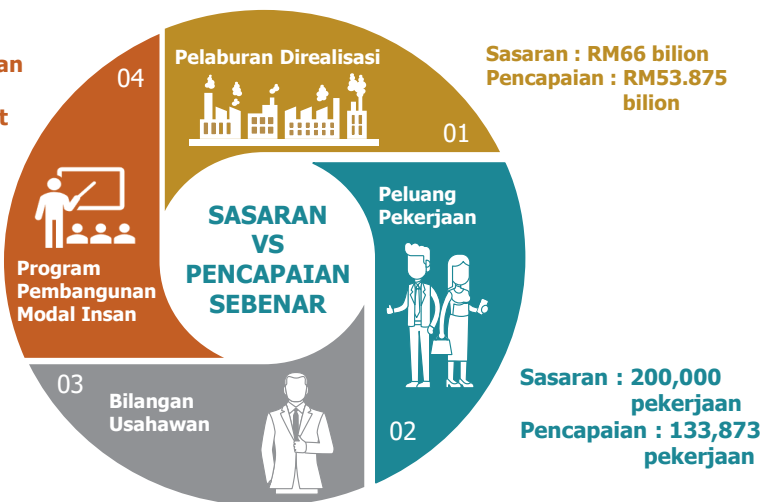

B. Pengukuran Pencapaian Objektif Projek & Program Tidak Dibuat

Pencapaian Pelaksanaan Sosioekonomi Projek & Program Tidak Dapat Diukur

Pencapaian pelaksanaan sosioekonomi projek dan program ECERDC **tidak dapat diukur** kerana **tiada pangkalan data** terhadap maklumat **pendapatan isi rumah dan garis kemiskinan** diwujudkan bagi Wilayah ECER.



C. Kelemahan Pengurusan Projek

i. Plot Perindustrian Tidak Diisi Dengan Pelabur

37 daripada **43** plot perindustrian tidak diisi dengan pelabur

Taman Industri Kuantan Malaysia-China (MCKIP 3)



Hanya **1** plot perindustrian telah diisi manakala **18** plot perindustrian masih **kosong** sejak 2017

Taman Biopolimer Kertih (KBP)



Hanya **4** plot perindustrian telah diisi manakala **6** plot perindustrian masih **kosong** sejak 2022

Taman Perikanan Bersepadu Tok Bali (TBIFP)



Hanya **1** plot perindustrian diisi dan **13** plot perindustrian masih **kosong** semenjak diserahkan kepada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) pada tahun 2017

**ii. Infrastruktur
Projek
Telah Siap
Tetapi Tidak
Digunakan**

Pembangunan
Ladang
Komersial
Kambing, Ulu
Tersat,
Terengganu

- **5 Animal Production Unit (APU)**, stor dan rumah pekerja bernilai **RM4.03 juta**.
- **Tiada Kebenaran Merancang (KM)**.

**iii. Infrastruktur
Rosak &
Tidak
Boleh
Digunakan**

Agropolitan
Besut Setiu
(BSA)

Pembangunan
Ladang
Pengganda dan
Ladang
Komersial
Kambing,
Terengganu

- **52 APU** bernilai **RM13.41 juta**.
- **39 buah rumah** peserta **mendap**.
- **Tiada rekod kerja-kerja rawatan tanah** pada skop kerja pembinaan dan pembinaan **tidak mengikut lukisan** pembinaan.

- **17 APU** bernilai **RM5.48 juta**.
- **Tiada KM**.



SYOR AUDIT



1

Mengkaji semula objektif, fungsi dan peranan ECERDC.

2

Menetapkan kaedah pengukuran dan mewujudkan pangkalan data pencapaian sosioekonomi.

3

Melaksanakan sesi libat urus dengan semua pihak terlibat dalam merangka strategi dan mempergiatkan aktiviti promosi.

